


# שירות המטאורולוגי

## שיקום חזיתות הבניין ושדרוג מערכות מ"א וחשמל

לוח זמנים בסיסי

קוד	שם פעילות	משך	התחלה	שיקום חזיתות הבניין ושדרוג מערכות מ"א וחשמל																							
				דצמ	2015, 1	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יוני	יולי	אוג	ספט	2015, 4	רבע 3	2015, 3	אוק	נוב	דצמ	2016, 1	ינו	פבר	מרץ	2016, 2	אפר	מאי
1	שם פעילות	391 ימים	15/01/15	[Bar chart showing activity across months]																							
2	ביצוע העבודות בשטח מערכות מ"א ואויר וניקוזים	234 ימים	15/01/15	[Bar chart showing activity across months]																							
3	התארגנות	14 ימים	15/01/15	[Bar chart showing activity across months]																							
4	הזמנת ציוד	80 ימים	01/02/15	[Bar chart showing activity across months]																							
5	פריסת צנרת גז כולל מעברים	45 ימים	18/02/15	[Bar chart showing activity across months]																							
6	ביצוע צנרת ניקוז	50 ימים	12/04/15	[Bar chart showing activity across months]																							
7	התקנת ציוד על הגג	30 ימים	14/07/15	[Bar chart showing activity across months]																							
8	פירוק מאגנים קיימים	20 ימים	18/08/15	[Bar chart showing activity across months]																							
9	התקנת יחידות פנימיות	40 ימים	09/06/15	[Bar chart showing activity across months]																							
10	חיבור והפעלה	30 ימים	10/09/15	[Bar chart showing activity across months]																							
11	מערכת חשמל	206 ימים	17/02/15	[Bar chart showing activity across months]																							
12	הזמנת לוחות חשמל	20 ימים	05/05/15	[Bar chart showing activity across months]																							
13	פריסת תעלות וברלים	60 ימים	17/02/15	[Bar chart showing activity across months]																							
14	ייצור ואספקת לוחות חשמל	60 ימים	28/05/15	[Bar chart showing activity across months]																							
15	אספקה והתקנת ג'י'ת	30 ימים	26/07/15	[Bar chart showing activity across months]																							
16	ניתוקים וחיבור למע' חדשה	40 ימים	30/08/15	[Bar chart showing activity across months]																							
17	עבודות בניה ואלומיניום	377 ימים	01/02/15	[Bar chart showing activity across months]																							
18	הזמנת חלונות אלומיניום	120 ימים	01/02/15	[Bar chart showing activity across months]																							
19	פירוק תקרות אקוסטיות	14 ימים	01/02/15	[Bar chart showing activity across months]																							
20	סיניר גבס ותקרות חדשות	80 ימים	09/06/15	[Bar chart showing activity across months]																							
21	שפכסל יאבע	60 ימים	10/09/15	[Bar chart showing activity across months]																							
22	עבודות איטום על הגגות	60 ימים	05/05/15	[Bar chart showing activity across months]																							
23	שיקום חזיתות הבניין	170 ימים	09/06/15	[Bar chart showing activity across months]																							
24	החלפת חלונות קיימים	60 ימים	31/07/15	[Bar chart showing activity across months]																							
25	עבודות ברייה ומערכות שונות	40 ימים	24/12/15	[Bar chart showing activity across months]																							
26	השלמות ומסירה	57 ימים	09/02/16	[Bar chart showing activity across months]																							

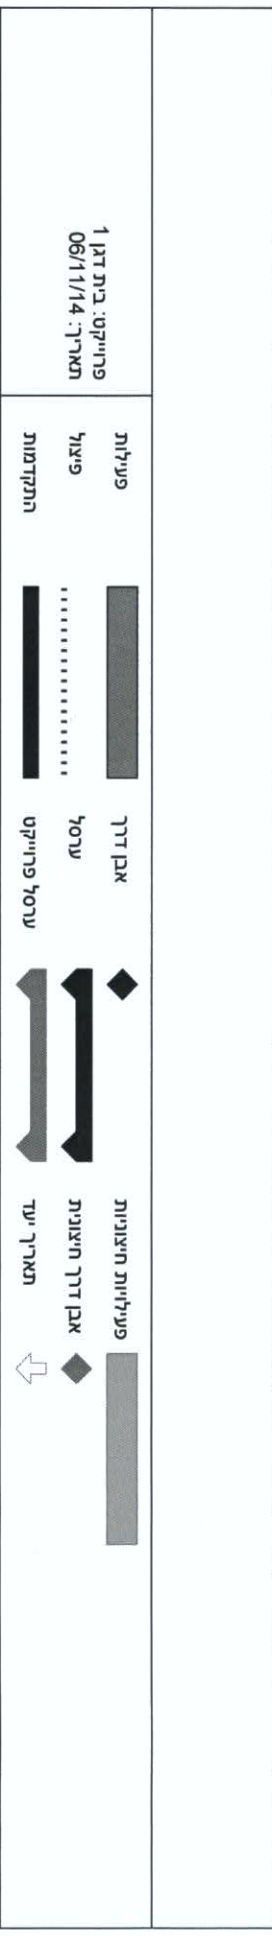

עמוד 1

פרייקט: בית דגן 1  
תאריך: 06/1/14

פעילות  
פיאול  
התקדמות

אבן דרך  
ערסל  
ערסל פרייקט

פעילויות חיצוניות  
אבן דרך חיצונית  
תאריך יעד
