

511723975 ח.פ


02.03.2026

לכבוד
 המרכז הרפואי לגליל
 נהריה
 לידי תמיר

הנדון: בדיקת ספיקה ולחצים

שעת הבדיקה	02 March 2026	14:15
בודק	משה כהן	
הערות:	הבדיקה בוצעה על ברו שריפה 3" היצא מקף 4" בשער כניסה ראשי של בית החולים	

Hydrant DIA .O.D	Test nozzel DIA .I.D	Static Pressure	Residual Pressure	Dynamic Pressure	Flow	Flow @ 0 Psi	Flow @ 20 Psi
INCHES	INCHES	Psi	Psi	Psi	Gpm	Gpm	Gpm
3"	1-1/2"	72	42	20	297	475	399

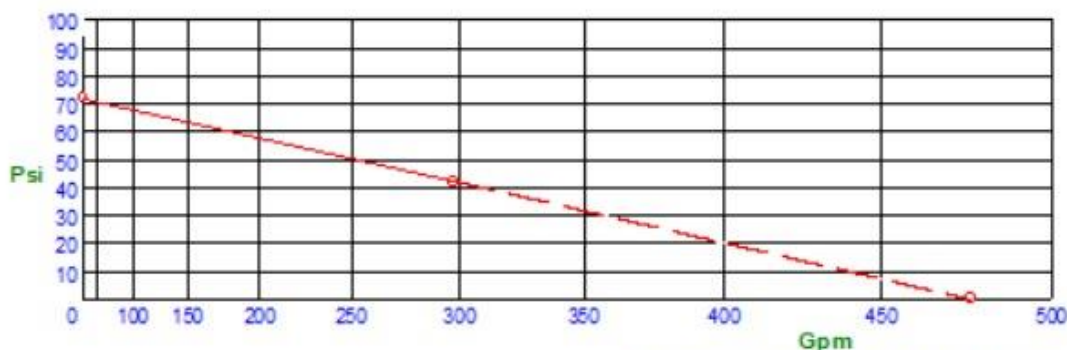

הבדיק הנעשת הע לפ ידרישו תותקני סהבאים:



דתון ישראלי 159 חלק 1. מערכת מותמים: התקנה.
 דרישת שירות הכבאות אגוד ערים ממנו בר 1996
 NFPA 13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems.
 Protection Systems 1999 Edition.
 NFPA 291 Recommended Practice for Fire Flow Testing and Marking of Hydrants.
 Protection Systems 1995 Edition.

The test were carried out with AKRON 905 instrument.

בכבודר,

משה כהן גילוי וכיבוי אש בע"מ

משה כהן
 גילוי וכיבוי אש בע"מ

המרת המידות:

1 Atm = 14.69 Psi
 1 Bar = 14.5 Psi
 1 Gal = 3.785 Liter
